

遊水池



プレキャスト遊水池は、地下水の高い現場や、大規模浸透貯留施設に有効な雨水浸透貯留製品です。プレキャスト部材の組合せで構築でき、工期短縮が図れ、かつ敷地に合わせた貯留層計画をすることが可能です。


底版部を砕石に置き換えることで浸透施設としても利用でき、(社)雨水貯留浸透技術協会と共同で浸透能力評価式を作成した数少ない大型施設工法でもあります。

G

貯留浸透遊水池の種類と設計条件

スタンドタイプ(地下水なし用・あり用)

スタンドタイプ施設の土被り範囲寸法図

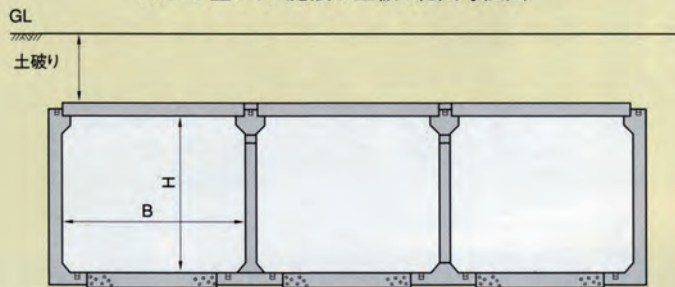

標準設置条件は原則として以下のとおりとする。

(1) 上載荷重 $q=10\text{kN/m}^2$ とする。 (2) 土被り範囲

スタンドタイプ施設地下水位
基礎底面下の場合の許容土被り

H	B	
1500~7000		3m~4m
		0~1.5m

注：内空高さHは50cm間隔とする。

ボックスタイプ

ボックス型タイプ施設の土被り範囲寸法図



標準設置条件は原則として以下のとおりとする。

(1) 上載荷重 $q=10\text{kN/m}^2$ とする。 (2) 土被り範囲

ボックス型タイプ施設地下水位
基礎底面下の場合の許容土被り

H	B	2m以下	~3m以下	~4m以下
1500~4000		0~3m	0~2m	0~1.5m

注：内空高さHは50cm間隔とする。

ボックス型タイプ施設地下水位
基礎底面以上の場合の許容土被り


H	B	2m以下	~3m以下	~4m以下
1500~4000		*1 0~2m	*2 0~2m	0~1.5m

*1 但し、内高1500・2000・2500は0~3m以下とする。

但し、内高4000は0~1.5m以下とする。


*2 但し、内高4000は0~1.5m以下とする。

浸透タイプ

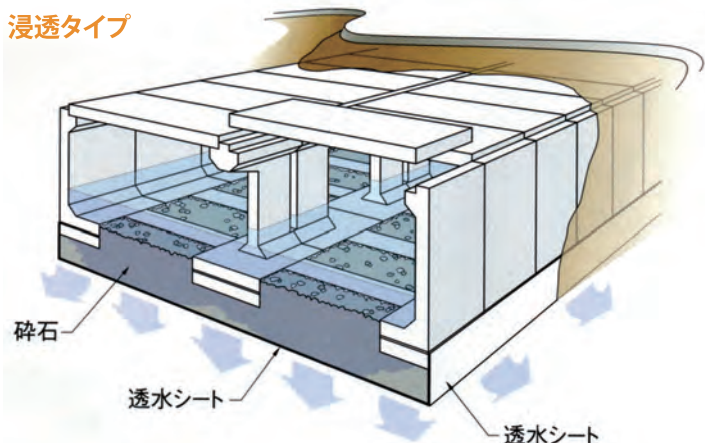


貯留浸透遊水池の寸法表（スタンドタイプ地下水なし用）

コーナースタック

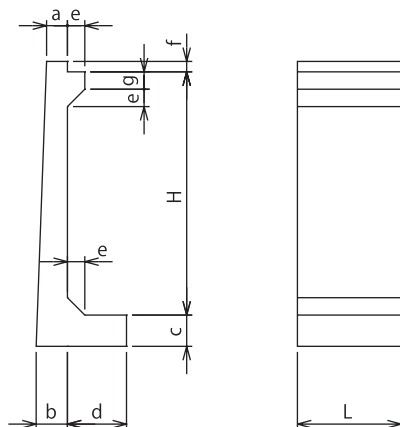

センタースタック

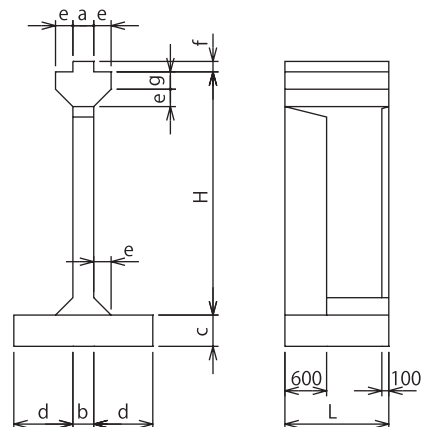


地下水なし

サイズ (コーナースタック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)	
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	3290	
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	3790	
H=2.5	2500	300	300	300	600	200	150	250	1995	5760	
H=3.0	3000	300	300	300	600	200	150	250	1995	6510	
H=3.5	3500	300	300	300	600	200	150	250	1495	5440	
H=4.0	4000	300	300	300	600	200	150	250	1495	6000	
H=4.5	4500	300	300	300	700	200	150	250	1495	6680	
H=5.0	5000	300	450	450	850	250	150	250	1495	9750	
H=5.5	5500	300	450	450	850	250	150	250	1495	10450	
H=6.0	6000	300	450	450	850	250	150	250	1495	11150	
H=6.5	6500	350	500	500	1000	250	150	250	1495	13700	
H=7.0	7000	400	550	550	1000	250	150	250	1495	15920	
サイズ (センタースタック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)	
										通水孔有	通水孔無
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	4130	4642
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	4400	5137
H=2.5	2500	250	250	300	600	200	150	250	1995	5200	6383
H=3.0	3000	250	250	300	600	200	150	250	1995	5530	6994
H=3.5	3500	250	250	300	600	200	150	250	1495	4360	5714
H=4.0	4000	250	250	300	600	200	150	250	1495	4600	6172
H=4.5	4500	250	250	300	700	200	150	250	1495	5080	6871
H=5.0	5000	300	300	450	850	250	150	250	1495	7670	10073
H=5.5	5500	300	300	450	850	250	150	250	1495	7970	10636
H=6.0	6000	300	300	450	850	250	150	250	1495	8270	11198
H=6.5	6500	400	400	500	1000	250	150	250	1495	11140	15363
H=7.0	7000	400	400	550	1000	250	150	250	1495	11990	16563


センタースタックは通水孔有もあります

貯留浸透遊水池の寸法表（スタンドタイプ地下水あり用）

コーナブロック

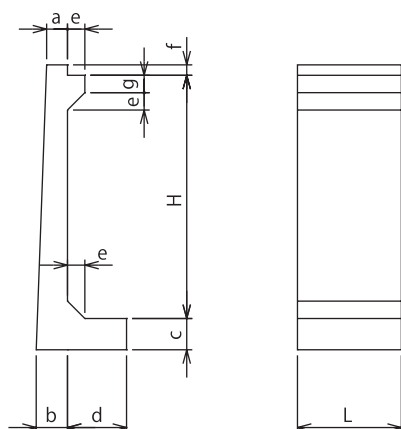

センターブロック

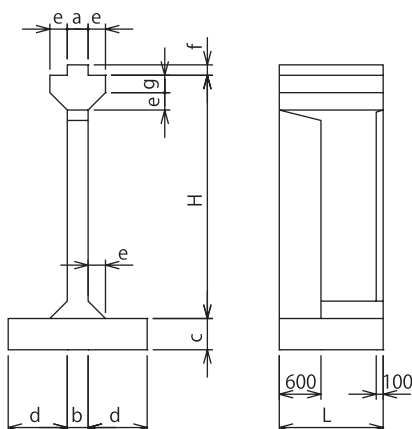


地下水あり

サイズ (コーナブロック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)	
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	3290	
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	3790	
H=2.5	2500	300	300	300	600	200	150	250	1995	5760	
H=3.0	3000	300	300	300	600	200	150	250	1995	6510	
H=3.5	3500	300	300	300	600	200	150	250	1495	5440	
H=4.0	4000	300	300	300	600	200	150	250	1495	6000	
H=4.5	4500	300	400	400	850	250	150	250	1495	8350	
H=5.0	5000	300	500	500	850	250	150	250	1495	10510	
H=5.5	5500	350	500	500	850	250	150	250	1495	11830	
H=6.0	6000	350	550	550	850	250	150	250	1495	13490	
H=6.5	6500	400	650	650	1000	250	150	250	1495	17220	
H=7.0	7000	450	700	700	1000	250	150	250	1495	19960	
サイズ (センターブロック)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	g(mm)	L(mm)	質量 (kg)	
										通水孔有	通水孔無
H=1.5	1500	200	200	300	600	200	150	250	1995	4130	4642
H=2.0	2000	200	200	300	600	200	150	250	1995	4400	5137
H=2.5	2500	250	250	300	600	200	150	250	1995	5200	6383
H=3.0	3000	250	250	300	600	200	150	250	1995	5530	6994
H=3.5	3500	250	250	300	600	200	150	250	1495	4360	5714
H=4.0	4000	250	250	300	600	200	150	250	1495	4600	6172
H=4.5	4500	300	300	400	850	250	150	250	1495	7000	9141
H=5.0	5000	300	300	500	850	250	150	250	1495	8050	10453
H=5.5	5500	300	300	500	850	250	150	250	1495	8340	11006
H=6.0	6000	300	300	550	850	250	150	250	1495	9020	11948
H=6.5	6500	400	400	650	1000	250	150	250	1495	12490	16713
H=7.0	7000	400	400	700	1000	250	150	250	1495	13330	17903

センターブロックは通水孔有もあります

遊水池

貯留浸透遊水池の寸法表（ボックスタイプ）

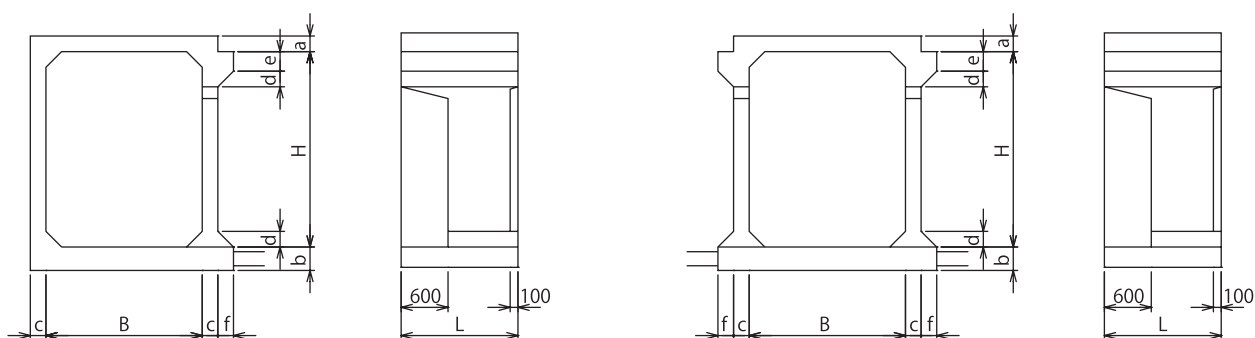

サイズ (ボックス型タイプ)	B'(mm)	H(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)	f(mm)	L(mm)	質量 (kg)	
										通水孔有	通水孔無
2.0×1.5×1.5 (タイプ1,2)	2000	1500	200	300	200	200	250	200	1495	7190	7590
2.0×1.5×1.5 (タイプ3)	2000	1500	200	300	200	200	250	200	1495	7360	8150
2.0×2.0×1.5 (タイプ1,2)	2000	2000	200	300	200	200	250	200	1495	7770	8340
2.0×2.0×1.5 (タイプ3)	2000	2000	200	300	200	200	250	200	1495	7760	8900
2.0×2.5×1.5 (タイプ1,2)	2000	2500	200	300	200	200	250	200	1495	8340	9090
2.0×2.5×1.5 (タイプ3)	2000	2500	200	300	200	200	250	200	1495	8150	9640
2.0×3.0×1.5 (タイプ1,2)	2000	3000	200	300	200	200	250	200	1495	8910	9830
2.0×3.0×1.5 (タイプ3)	2000	3000	200	300	200	200	250	200	1495	8550	10390
2.0×3.5×1.5 (タイプ1,2)	2000	3500	200	300	250	200	250	200	1495	10720	12080
2.0×3.5×1.5 (タイプ3)	2000	3500	200	300	250	200	250	200	1495	9930	12640
2.0×4.0×1.5 (タイプ1,2)	2000	4000	200	300	250	200	250	200	1495	11430	13010
2.0×4.0×1.5 (タイプ3)	2000	4000	200	300	250	200	250	200	1495	10420	13570

(通水孔有もあります)

貯留浸透遊水池の寸法表（頂版スラブ）

頂版スラブ（フェリースラブ）

サイズ	幅(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	質量 (kg)
2m用	1960	220	1495	1620
3m用	2960	280	1495	3110
4m用	3960	280	1495	4160
3m用	2960	280	1995	4140
4m用	3960	280	1995	5530

遊水池

貯留浸透遊水池の歩掛表（スタンドタイプ）

トルク連結型据付け歩掛り（地下水あり）

（1本当り）

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17
特殊作業員	人	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.57	0.50	0.57	0.50	0.67	0.57	0.80	0.67	0.80	0.67
普通作業員	人	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.38	0.30	0.38	0.38	0.43	0.38	0.43	0.38	0.50	0.43	0.60	0.50	0.60	0.50
ラフ テレーン	運転日数	日	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.20	0.17	0.20	0.17
	規格	t	25		25		25		35		25		25		35		45		50		100		100		100
諸雑費	%	5																							

- 備 考
- 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。
 - トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
 - 諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
 - ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。

PC緊張連結型据付け歩掛り（地下水あり）

（1本当り）

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20
特殊作業員	人	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.44	0.44	0.57	0.44	0.57	0.57	0.67	0.57	0.67	0.57	0.80	0.67	1.00	0.80	1.00	0.80
普通作業員	人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33	0.43	0.43	0.50	0.43	0.50	0.43	0.60	0.50	0.75	0.60	0.75	0.60
ラフ テレーン	運転日数	日	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.25	0.20
	規格	t	25		25		25		35		25		25		35		45		50		100		100		100
諸雑費	%	5																							

- 備 考
- 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材による縦締め歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。
 - トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
 - 諸雑費はレバーブロック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタルと頂部コンクリート充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
 - ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。

目地工歩掛り（地下水なし）

（1本当り）

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.08	0.05	0.09	0.05
防水工	人	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.10	0.06	0.11	0.07	0.13	0.08	0.15	0.09	0.16	0.09	0.17	0.09	0.18	0.09
ポリウレタン樹脂	kg	0.82	1.13	1.02	1.13	1.22	1.16	1.42	1.16	1.62	1.16	1.82	1.16	2.06	1.24	2.32	1.48	2.51	1.48	2.71	1.48	2.97	1.68	3.17	1.68
諸雑費	%	5																							

- 備 考
- 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
 - ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
 - 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

目地工歩掛り（地下水あり）

（1本当り）

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		4500 (mm)		5000 (mm)		5500 (mm)		6000 (mm)		6500 (mm)		7000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10	0.13	0.09	0.14	0.09	0.15	0.10	0.17	0.10	0.18	0.11	0.20	0.11	0.22	0.11	0.24	0.11
防水工	人	0.16	0.20	0.18	0.20	0.22	0.21	0.24	0.21	0.26	0.18	0.30	0.18	0.32	0.21	0.36	0.21	0.39	0.21	0.42	0.21	0.47	0.23	0.50	0.23
ポリウレタン樹脂	kg	1.96	3.10	2.21	3.10	2.47	3.15	2.73	3.15	2.76	2.70	3.00	2.70	3.38	3.06	3.65	3.06	3.89	3.06	4.15	3.06	4.49	3.29	4.74	3.29
諸雑費	%	5																							

- 備 考
- 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
 - ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
 - 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

遊水池

貯留浸透遊水池の歩掛表（ボックスタイプ）

トルク連結型据付け歩掛り

(1本当り)

項目		単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
			コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役		人	0.13		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14	
特殊作業員		人	0.50		0.50		0.50		0.50		0.57		0.57	
普通作業員		人	0.38		0.38		0.38		0.38		0.43		0.43	
ラフ レーン デクレーン	運転日数	日	0.13		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14	
	規格	t	35		35		35		35		45		45	
諸雑費		%	5											

- 備考 1. 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材によるトルク連結の歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立までの一連の作業とします。
 2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
 3. 諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
 4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けれるものとします。

PC緊張連結型据付け歩掛り

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)		
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	
世話役	人	0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17		
特殊作業員	人	0.57		0.57		0.57		0.57		0.67		0.67		
普通作業員	人	0.43		0.43		0.43		0.43		0.50		0.50		
ラフ テレン クレーン	運転日数	日	0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17	
	規格	t	35		35		35		35		45		50	
諸雑費	%	5												

- 備考 1. 歩掛りは据付け歩掛りと PC 鋼材による縦締め歩掛りで、PC 鋼材の挿入、組立、緊張、グラウト注入までの一連の作業とします。
 2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
 3. 諸雑費はレバーブロック・油圧ジャッキ・ポンプ・グラウトポンプ・ミキサー等の敷設緊張器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
 4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けれるものとします。

目地工歩掛り(地下水なし)

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08
防水工	人	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15	0.18	0.15	0.19	0.17	0.20	2.97
ポリウレタン樹脂	kg	2.75	2.89	2.94	2.89	3.14	2.89	3.34	2.89	3.58	2.97	3.78	2.97
諸雑費	%	5						25					

- 備考 1. 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
 2. ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
 3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

目地工歩掛り(地下水あり)

(1本当り)

項目	単位	1500 (mm)		2000 (mm)		2500 (mm)		3000 (mm)		3500 (mm)		4000 (mm)	
		コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック	コーナー ブロック	センター ブロック
世話役	人	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	0.17	0.21	0.18	0.23	0.19	0.25	0.19
防水工	人	0.33	0.35	0.36	0.35	0.37	0.34	0.42	0.36	0.46	0.37	0.48	0.37
ポリウレタン樹脂	kg	4.04	4.78	4.30	4.78	4.55	4.78	4.80	4.78	5.12	4.88	5.37	4.88
諸雑費	%	5						25					

- 備考 1. 歩掛りはポリウレタン樹脂を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。
 2. ポリウレタン樹脂はプライマー及び作業上のロスを含みます。
 3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。

G

貯留浸透遊水池

遊水池

貯留浸透遊水池の歩掛表（頂版スラブ）

頂版スラブ据付工歩掛り

(1枚当たり)

種目	単位	2m 用	3m 用	4m 用
世話役	人	0.04	0.04	0.04
特殊作業員	人	0.04	0.04	0.04
普通作業員	人	0.08	0.08	0.08
トラック 賃料	日	0.04	0.04	0.04
クレーン 吊上げ荷重	t	本体ブロック据付けクレーン使用		
諸雑費	%	4		

備考

1. 歩掛りは据付けとボルトによる連結工の一連の作業とします。
2. トラッククレーンは油圧伸縮ジブ型とし賃料とします。
3. 諸雑費はレバーブロック等の敷設器具の損料及びモルタル充填費であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を計上してください。
4. ブロックは車上渡しとし、直接据付けるものとします。

頂版スラブ目地工歩掛り(スタンドタイプ)

(1箇所当り)

3m 用																													
項目	単位	地下水なし												地下水あり															
		公称内高 (mm)																											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000				
世話役	人	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.15	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17				
防水工	人	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.31	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31	0.31	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34				
ポリウレタン樹脂	kg	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85				
諸雑費	%	5		25										5		25													
4m 用																													
項目	単位	地下水なし												地下水あり															
		公称内高 (mm)																											
		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000				
世話役	人	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				
防水工	人	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.36	0.40	0.40	0.40	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40				
ポリウレタン樹脂	kg	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	2.47	2.47	2.47	2.47	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36				
諸雑費	%	5		25										5		25													
備 考	1. 歩掛りはポリウレタンシーリング剤を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。														1. 歩掛りはポリウレタンシーリング剤を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。														
	2. ポリウレタン材料はプライマー及び作業上のロスを含みます。														2. ポリウレタン材料はプライマー、トップコート及び作業上のロスを含みます。														
	3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。														3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。														

頂版スラブ目地工歩掛り(ボックスタイプ)

(1箇所当り)

2m 用													
項目	単位	地下水なし						地下水あり					
		1500(mm)	2000(mm)	2500(mm)	3000(mm)	3500(mm)	4000(mm)	1500(mm)	2000(mm)	2500(mm)	3000(mm)	3500(mm)	4000(mm)
世話役	人	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
防水工	人	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
ポリウレタン樹脂	kg	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
諸雑費	%	5		25				5		25			
3m 用													
項目	単位	地下水なし						地下水あり					
		1500(mm)	2000(mm)	2500(mm)	3000(mm)	3500(mm)	4000(mm)	1500(mm)	2000(mm)	2500(mm)	3000(mm)	3500(mm)	4000(mm)
世話役	人	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
防水工	人	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
ポリウレタン樹脂	kg	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
諸雑費	%	5		25				5		25			
4m 用													
項目	単位	地下水なし						地下水あり					
		1500(mm)	2000(mm)	2500(mm)	3000(mm)	3500(mm)	4000(mm)	1500(mm)	2000(mm)	2500(mm)	3000(mm)	3500(mm)	4000(mm)
世話役	人	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
防水工	人	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
ポリウレタン樹脂	kg	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
諸雑費	%	5		25				5		25			
備 考		1. 歩掛りはポリウレタンシーリング剤を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。						1. 歩掛りはポリウレタンシーリング剤を使用したプライマー塗布、マスキングテープ貼り、コーキング等の一連の作業とします。					
		2. ポリウレタン材料はプライマー及び作業上のロスを含みます。						2. ポリウレタン材料はプライマー、トップコート及び作業上のロスを含みます。					
備 考		3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。						3. 諸雑費は目地工に必要な資機材料、足場工等の費用であり、労務費に上表の率を乗じた金額を計上してください。					
